-51+25.3 - Tri
Chaining W. N. side sec. 15-90-19

52+22.3 = N. E. cor. sec 16-90-19 in Riv

51+80.0 - E Bank of River

50+42.3 - to R. N. & S. R.L. 15.4' S. of corner

50+29.3 = found Witness Cor. L. S. & bearing Tree (elm) 15.45' N. of R.L.

Set S.C.M. 3" up.

39+14.5 = 3/0 to R. N. & S.

26+34.5 = Nail on R.L.

26+13.3 = pt. Est. cor N½ 15-90-19 midway ± on line

26+00.0 - Stake

21+00.0 = E Bank of Slough

17+03.5 = E Bank of Slough

13+12.3 = 1/4 1/4 to R. S.
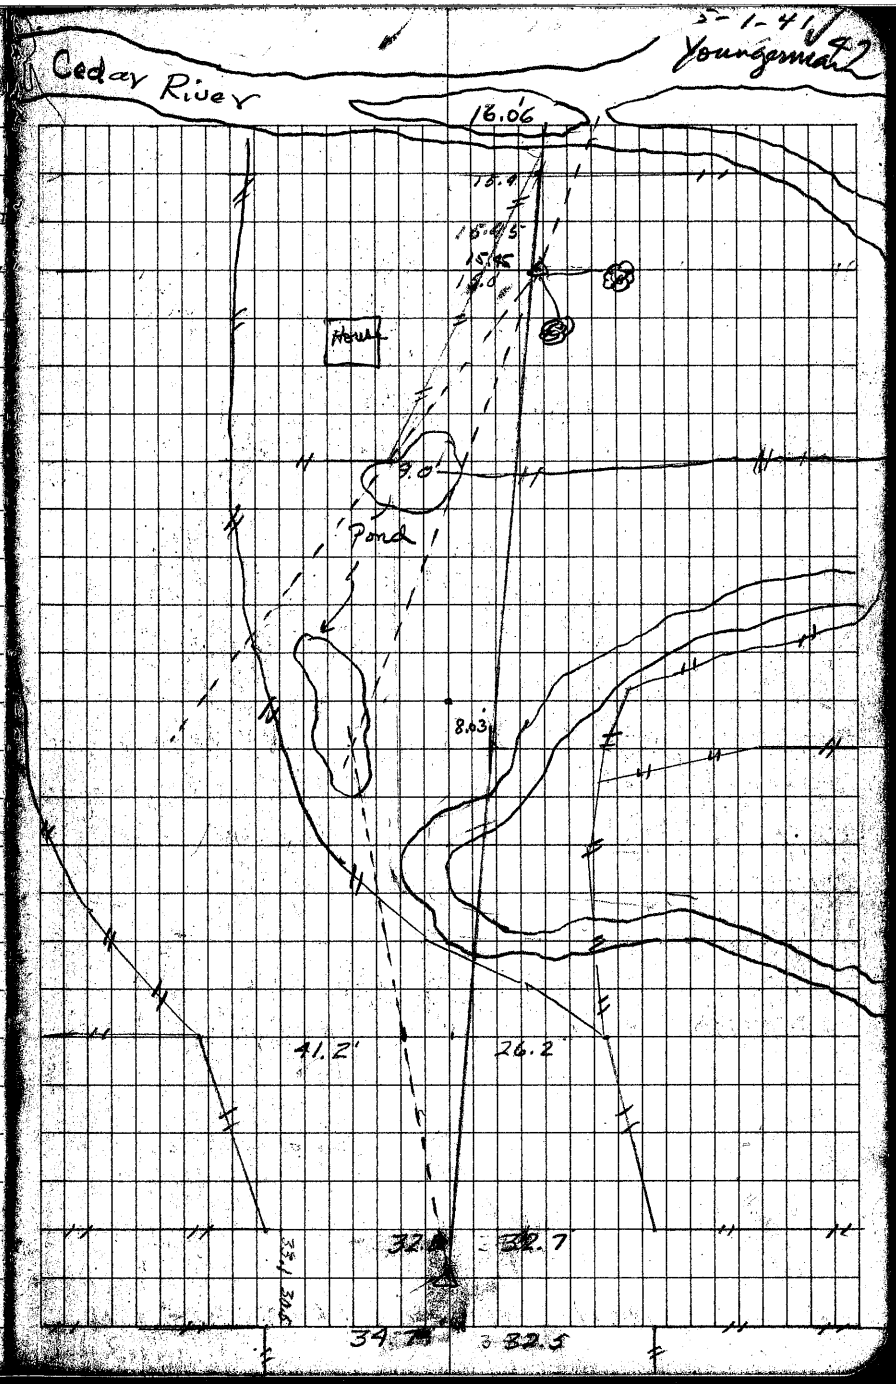
0+00 - N. E. cor. 15-90-19 S
